기획

무엇을, 누구를 위해, 어디까지 I Software Engineering

최성철 교수
Director of TEAMLAB

지난 시간까지
도구를 배웠습니다

Git, GitHub, 그리고 AI 에이전트

무엇이든 만들 수 있는 상태가 됐습니다

그런데

도구는 무엇을 만들지 알려주지 않습니다

첫 시간을 다시 꺼냅니다

코드는 싸졌다

그럼 뭐가 비싸졌나

무엇을 만들 것인가

누구를 위해 만들 것인가

어디까지가 이번 버전인가

이 셋을 정하는 일을

기획

올해 이 수업에서

기획은 곁가지가 아니라 본체입니다

오늘의 순서

1. 기획이 답하는 네 가지
2. Scope — 어디까지 할 것인가
3. 누구를 위해 — 페르소나와 요구사항
4. 일 쪼개기 — WBS 와 칸반
5. 쓰기 — 그리고 AI 가 쓴 글을 고치는 법

1. 기획이 답하는 네 가지

Objectives of Planning

Object
목표를 정의한다
왜 이걸 만드는가

Scope
범위를 정한다
어디까지 할 것인가

Work activities
일을 쪼개고 계획한다
무엇을 언제

Resource
자원을 배분한다
누가, 얼마로

이 네 가지는 1인 개발이라고 사라지지 않는다. 답하는 사람이 나 하나가 될 뿐이다.

작년까지는 이 넷을

팀이 나눠 답했습니다

올해는

네 개를 혼자 답합니다

그래서 Resource 칸이 바뀝니다

사람 수가 아니라 내 시간, 구독료, 토큰, 배포 비용입니다

Object — 왜 이걸 만드나

Why an organization have to do the project?

조직이 이 일을 왜 해야 하는가

전통적으로는

기대 수익은 얼마인가

조직의 전략을 어떻게 뒷받침하는가

경영진(Stakeholders)을 어떻게 설득할 것인가

이번 학기 여러분의 Stakeholder는

교수가 아니라 그 서비스를 쓸 사람입니다

설득하지 못하면
만들 이유가 없습니다

Cost-benefit Analysis

유형 이익 — 측정하기 쉬운 것

비용 절감과 회피, 오류 감소

유연성 증가, 업무 속도 증가

경영 계획 및 통제의 개선

무형 이익 — 측정이 어려운 것

조직 유연성 증가, 직원 사기 증진

경쟁적 필요성, 더 시기적절한 최신 정보

조직의 학습과 이해 증진

유형 이익은 이렇게 계산합니다

[그림 4-7]

Pine Valley Furniture의 고객추적시스템에 대한 유형이익 워크시트

유형이익 워크시트
고객추적시스템 프로젝트

	1년부터 5년까지
A. 비용 감소나 회피	$4,500
B. 오류 감소	$2,500
C. 유연성 증가	$7,500
D. 활동 속도의 증가	$10,500
E. 경영 계획 및 통제의 개선	$25,000
F. 기타 _____	0
총 유형이익	**$50,000**

숫자로 쓸 수 있는 것부터 적는다. 못 적는 것은 무형 이익으로 따로 둔다.

1인 개발의 비용은

인건비가 아니라 내 시간과 토큰비입니다

그리고 가장 비싼 비용은

잘못된 것을 만드는 데 쓴 4주입니다

2. Scope

The work that needs to be accomplished

특정한 기능과 사양을 갖춘 제품·서비스·결과물을 내놓기 위해 필요한 일

업무의 범위

약은 약사에게



약사의 Scope는 약을 짓는 일이다. 진단은 Scope 밖이다. 경계가 곧 전문성이다.

Scope에 대한 세 가지 오해

오해 1 — Scope는 시간·장소·인원 얘기다

아닙니다. 무엇을 할지와 하지 않을지의 얘기입니다

오해 2 — Scope는 바뀌지 않는다

바뀝니다. 다만 바뀔 때마다 기록하고 합의해야 합니다

오해 3 — Scope는 고객의 Needs다

Needs는 Scope의 재료일 뿐입니다

Scope의 공식

```
Needs + Resources + Location + Schedule +
Budget


=  Scope
```

Needs →

Requirement →

Scope

멀리 갈 것 없습니다

우리 캠퍼스에 4년 전에 있었던 일입니다

대연캠퍼스 백경광장

2022년 11월 11일 개통

원래도 나무는 있었습니다

공원처럼 쓰이긴 했습니다

앉을 데도 있고, 나무도 있었습니다

그런데 차가 다녔습니다

밤에는 술자리가 있었고요

나쁘진 않았습니다. 다만 캠퍼스의 중심은 아니었습니다

없던 건 나무가 아니라
'여기가 중심이다'라는 자리였습니다

같은 광장을 세 단계로

Needs

나무는 있는데
제대로 쓰지 못한다

차가 다니고, 중심이 없다

Requirement

보행자 전용일 것,
앉아서 쉴 공간이 있을 것,

캠퍼스 중앙에 있을 것

Scope

수목 정리 범위 확정
중앙광장 조성

2022. 11. 11. 개통

왼쪽은 불편, 가운데는 조건, 오른쪽은 범위와 날짜다.

Needs는 누구나 말합니다

불편하다는 말은 10년째 나왔습니다

Requirement는 조건입니다

보행자 전용, 중앙, 앉을 곳

Scope는 범위와 날짜입니다

어디까지 손대고, 언제까지 끝낼 것인가

날짜와 범위가 안 나오면
아직 기획이 아닙니다

그리고 이 사업에도 Out of Scope가 있었습니다

나무를 전부 없앤 게 아니라, 어디까지 정리할지를 정한 것입니다

그래서 어떻게 됐나

벚꽃은 원래 있었습니다

대연캠퍼스에만 벚나무 500여 그루

벚꽃축제도 2014년부터 하고 있었습니다

없던 건 그 벚꽃을
볼 자리였습니다

광장이 생기자

벚꽃이 배경이 됐습니다

부산 벚꽃 명소로 알려졌고

2025년에는 캠퍼스 17경 둘레길의 자연 테마에 들어갔습니다

인스타그래머블한
캠퍼스가 된 겁니다

여기서 하나만 짚고
갑시다

Scope에 이런 문장은 없었습니다

"인스타에 올리고 싶은 캠퍼스를 만든다"

적혀 있던 건 이것뿐입니다

보행자 전용, 중앙, 앉을 곳, 그리고 개통일

잘 지킨 Scope 위에
계획에 없던 것이 얹힙니다

그런데 그건 결과이지

Scope가 아닙니다

Scope에 그걸 적었다면

검증할 수 없는 요구사항이 됐을 겁니다

이 얘기는
요구사항 장에서 다시 합니다

Scope란 결국

뭘 하고
뭘 하지 말아야 하는지

얼마나 그 일을 할 것인지
결정하는 것

여기서 많이들 빠뜨립니다

하지 않을 일을 적는 칸

Out of Scope

이번 버전에서 하지 않을 것을 적으세요

이걸 안 적으면 학기 말에 반드시 후회합니다

예를 들면 이런 것들

결제 기능은 이번 버전에서 하지 않는다

모바일 앱은 만들지 않는다. 반응형 웹까지만

관리자 통계 화면은 다음 버전

스코프 크립

하나만 더, 하나만 더 하다가 아무것도 못 끝내는 것

이번 버전은
어디까지입니까?

3. 누구를 위해 만드나

사용자가 없는 기획은

그냥 내 취향입니다

페르소나

통계가 아니라 한 사람입니다

'20대 대학생'이 아니라 '3학년 김민수'입니다

페르소나에 들어가는 것

이름과 한 줄 소개

상황 — 어떤 맥락에서 이 서비스를 만나는가

목표 — 무엇을 하려고 왔는가

불편 — 지금은 그걸 어떻게 하고 있고 뭐가 괴로운가

제약 — 기기, 시간, 지식 수준

페르소나 예시

김민수 / 3학년 / 공대

상황 강의동 화장실 문이 고장난 걸 발견

목표 5분 안에 신고하고 잊어버리고 싶다

불편 어디에 신고해야 하는지 모른다. 전화는 안 받는다

제약 폰만 들고 있다. 로그인 절차가 길면 포기한다

마지막 줄이 핵심입니다

'로그인이 길면 포기한다'가 곧 요구사항이 됩니다

사용자 스토리

한 줄 형식

```
<누가> 로서
<무엇을> 하고 싶다
<왜냐하면> ...

# 학생으로서, 사진 한 장으로 신고하고 싶다
# 왜냐하면 글로 설명하기가 번거롭기 때문이다
```

왜 를 적게 하는 이유

왜가 있어야 다른 방법으로 풀 수 있는지 판단이 됩니다

4. 요구사항

Needs를 실행 가능한 문장으로

바꿔 적은 것이 요구사항입니다

두 종류가 있습니다

기능적 요구사항

무엇을 할 수 있어야 하는가

비기능적 요구사항

어떤 품질로 동작해야 하는가

기능적 요구사항 — 실제 양식

번호	화면명	요구사항명	상세설명	우선순위
1	로그인	로그인	학번으로 바로 로그인	필수
2	신고등록	민원 접수	시설 고장을 신고한다	필수
3	신고등록	사진 첨부	사진 최대 3장	선택

작년 학생들이 실제로 낸 표다. 이번 학기에도 이 형식으로 낸다.

비기능적 요구사항 — 칸이 두 개 는다

번호	특성	요구사항명	상세설명	이해관계자
1	사용성	상태 색상 표시	처리 상태를 색으로 구분	사용자·관리자
2	성능	목록 1초 이내	신고 목록 응답 1초 이내	사용자
3	보안	학내 인증 연동	외부인 접근 차단	관리자

특성 칸에 사용성·성능·보안·확장성 같은 품질 이름이 들어간다.

비기능 요구사항의 함정

'빨라야 한다'는 요구사항이 아닙니다

'1초 이내'여야
요구사항입니다

측정할 수 없으면

검증할 수 없고, 검증할 수 없으면 요구사항이 아닙니다

우선순위

전부 필수라고 적으면

우선순위를 안 정한 것과 같습니다

MoSCoW

Must — 없으면 서비스가 성립하지 않는다

Should — 없으면 많이 아쉽다

Could — 있으면 좋다

Won't — 이번 버전에서는 안 한다

Won't 칸이 곧 Out of Scope입니다

2장과 여기가 이어집니다

유스케이스

요구사항이 실제로 어떻게 흐르는지

한 시나리오로 적어 보는 것

유스케이스 한 칸

기능명 민원 접수하기

전제조건 로그인 상태여야 한다

사후조건 신고 목록에 신규 항목이 추가된다

흐름 1. 등록 버튼을 누른다

2. 내용을 입력하고 저장을 누른다

3. 시스템이 저장하고 등록완료를 알린다

전제조건과 사후조건을 적게 하는 이유

여기서 빠진 예외가 나중에 전부 버그가 됩니다

그다음 산출물

화면과 데이터

기능 명세서 — 페이지별로 어떤 동작이 붙는가

와이어프레임 — 뭐가 어디에 놓이는가

스토리보드 — 화면이 어떤 순서로 이어지는가

화면 설계서 — 각 요소의 동작과 예외

스키마 정의서 · ERD — 어떤 데이터를 어떻게 담는가

이 순서에는 이유가 있습니다

사람 → 요구 → 흐름 → 화면 → 데이터

데이터부터 짜면
반드시 다시 짭니다

5. 일 쪼개기

Work activities

각 작업과 완료 시점, 담당자, 산출물을 적은 일정

작업 목록은 이런 모양

Task Number	Task Name	Duration (in weeks)	Dependency	Status
1	Identify vendors	2		Complete
2	Review training materials	6	1	Complete
3	Compare vendors	2	2	In Progress
4	Negotiate with vendors	3	3	Open
5	Develop communications information	4	1	In Progress
6	Disseminate information	2	5	Open
7	Create and administer survey	4	6	Open
7.1	Create initial survey	1		Open
7.2	Review initial survey	1	7.1	Open
7.2.1	Review by Director of IT Training	1		Open
7.2.2	Review by Project Sponsor	1		Open
7.2.3	Review by Representative Trainee	1		Open
7.3	Pilot test initial survey	1	7.1	Open
7.4	Incorporate survey changes	1	7.2, 7.3	Open
7.5	Create distribution list	0.5		Open
7.6	Send survey to distribution list	0.5	7.4, 7.5	Open
7.7	Send follow-up message	0.5	7.6	Open
7.8	Collect completed surveys	1	7.6	Open
8	Analyze results and choose vendor	2	4, 7	Open
9	Build new classrooms	11	1	In Progress
10	Develop course options	3	8, 9	Open

작업명 · 기간 · 선행 작업 · 상태. 지금은 이걸 이슈 트래커가 대신한다.

Work Breakdown Structure


업무를 단위 업무로 조각내서

관리하는 방법

Phases vs. Deliverables

단계로 쪼갤 것인가, 산출물로 쪼갤 것인가

단계로 쪼개면

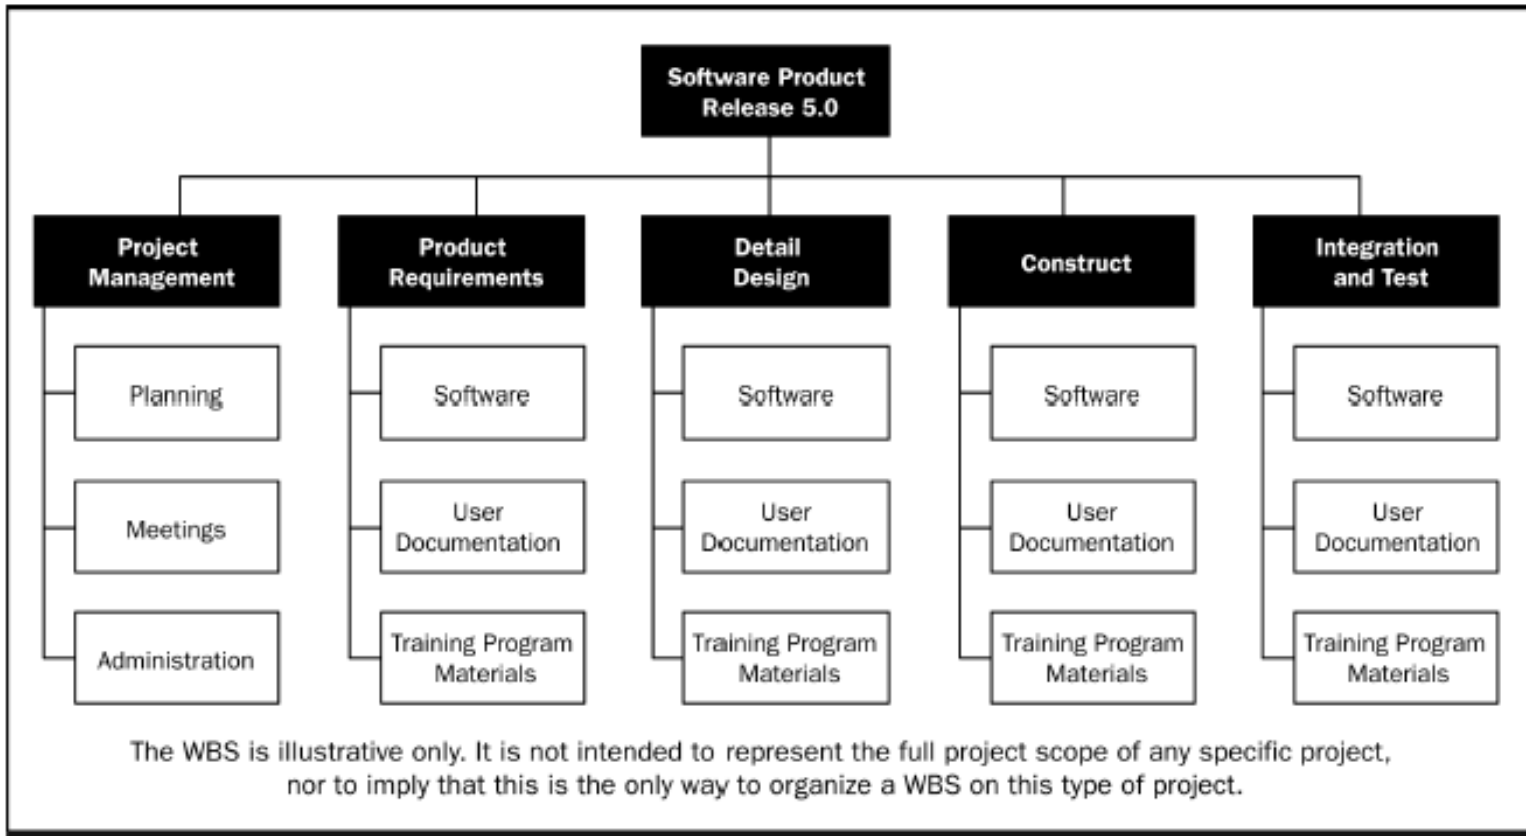


Project Management · Product Requirements · Detail Design · Construct · Integration and Test

계층으로 적으면

Level 1	Level 2	Level 3
1 Widget Management System	1.1 Initiation	1.1.1 Evaluation & Recommendations 1.1.2 Develop Project Charter 1.1.3 Deliverable: Submit Project Charter 1.1.4 Project Sponsor Reviews Project Charter 1.1.5 Project Charter Signed/Approved
	1.2 Planning	1.2.1 Create Preliminary Scope Statement 1.2.2 Determine Project Team 1.2.3 Project Team Kickoff Meeting 1.2.4 Develop Project Plan 1.2.5 Submit Project Plan 1.2.6 Milestone: Project Plan Approval
	1.3 Execution	1.3.1 Project Kickoff Meeting 1.3.2 Verify & Validate User Requirements 1.3.3 Design System 1.3.4 Procure Hardware/Software 1.3.5 Install Development System 1.3.6 Testing Phase 1.3.7 Install Live System 1.3.8 User Training 1.3.9 Go Live
	1.4 Control	1.4.1 Project Management 1.4.2 Project Status Meetings 1.4.3 Risk Management 1.4.4 Update Project Management Plan
	1.5 Closeout	1.5.1 Audit Procurement 1.5.2 Document Lessons Learned 1.5.3 Update Files/Records 1.5.4 Gain Formal Acceptance 1.5.5 Archive Files/Documents

Level 1 · 2 · 3 으로 번호를 매겨 내려간다.

트리로 그리면

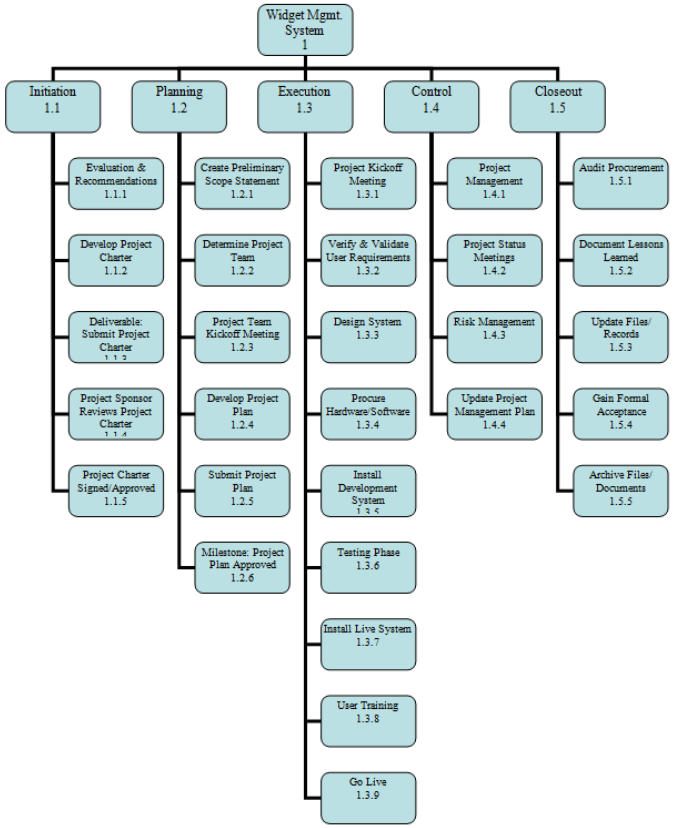


같은 내용을 그림으로 본 것. 어느 쪽이든 무방하다.

한 칸을 열면 이렇게

WBS #:	1.1.1	**Task:**	Create Plan
Est. Level of Effort:	40 hrs	**Owner:**	Project Manager
Resources Needed:	Subject Matter Experts	**Work Products:**	MS Project Plan
Description of Task:	Development of a detailed project plan that lists all key resources, tasks, milestones, dependencies, and durations.		
Input:	• Approved Project Charter • SMEs		
Dependencies:	• Approval of Budget		
Risk:	• Changes to IT Apps plans and deliverables • IT Apps implementation releases, which conflict with implementation		
WBS #:	1.1.2	**Work Item:**	Make Budget
Est. Level of Effort:	16 hrs	**Owner:**	Project Manager
Resources Needed:	CFO, CIO, Executive Sponsor	**Work Products:**	ITPR
Description of Task:	Development and documentation of the project budget based on plan and resources.		
Input:	• Approved Project Charter • SMEs		
Dependencies:	• Approval of Project Charter		
Risk:	• Changes to IT Apps plans and deliverables • IT Apps implementation releases which conflict with implementation		

작업마다 예상 공수, 필요 자원, 산출물, 선행 조건, 위험이 붙는다.

그리고 일정으로 펼치면

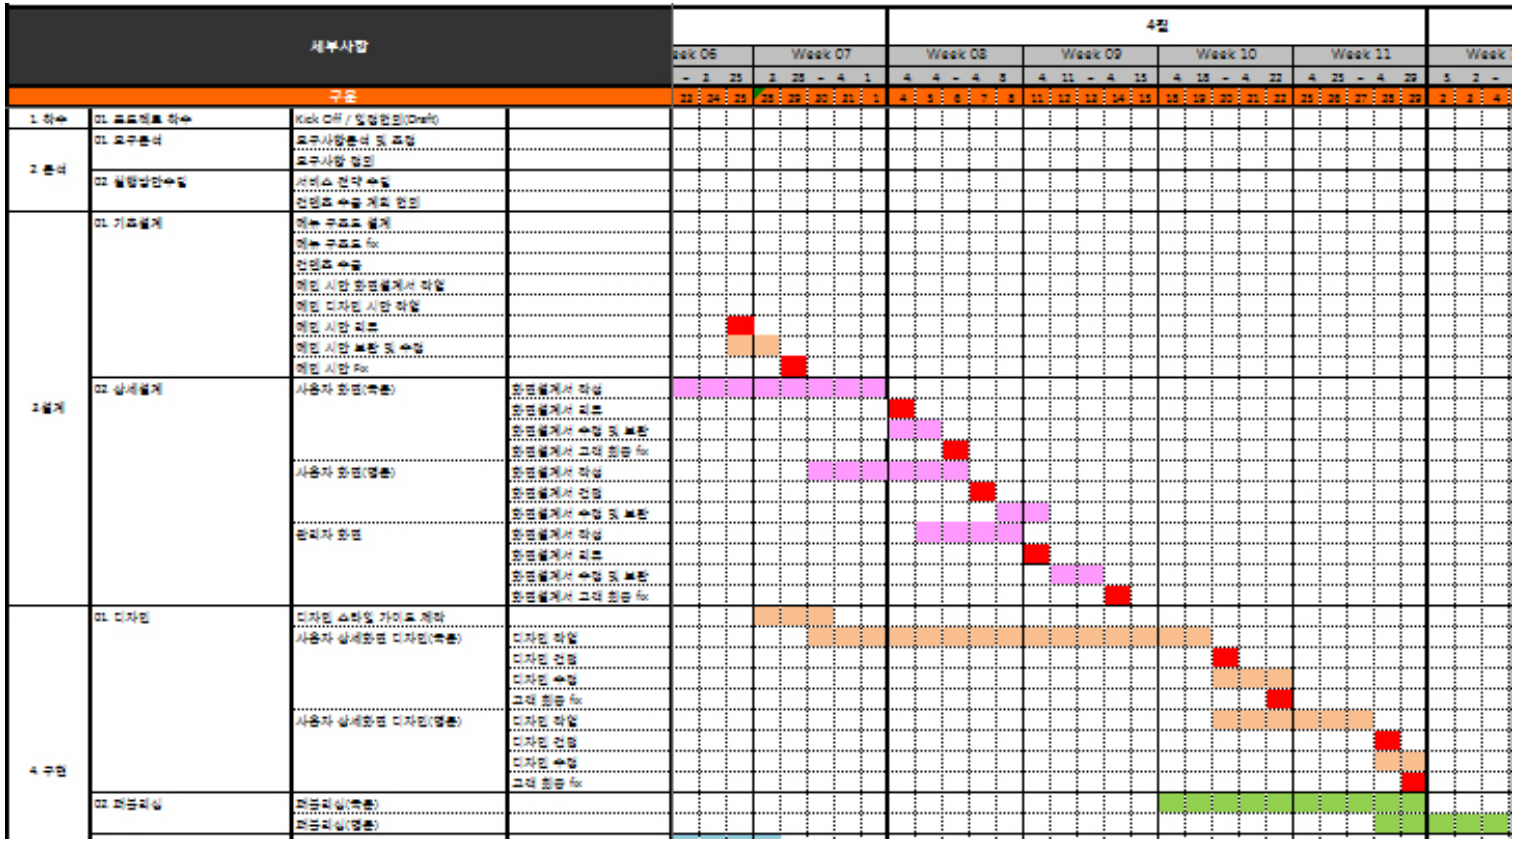

쪼갠 작업에 기간을 붙이면 일정표가 된다. WBS 가 먼저이고 일정이 나중이다.

Deliverables

업무의 결과로 나오는 산출물

문서, 통계자료, 코드, 채용 결과 등 유형은 다양하다

산출물이 중요한 이유

산출물을 기준으로 모든 의사결정을 한다

일종의 레고 블록이다

작은 산출물이 모여 큰 산출물이 된다

업무를 쪼개는 규칙

더 이상 쪼갤 수 없는 수준까지 쪼갠다

구분 가능한 산출물이 있는 블록으로 나눈다

하나의 업무에는 하나 이상의 산출물이 나와야 한다


일주일이 넘는 업무는 산출물 기준으로 다시 쪼갠다

마지막 줄이 실전에서 제일 중요합니다

일주일 넘게 산출물이 없는 일은 진행 상황을 알 수 없습니다


칸반

보드 하나로 상태를 본다

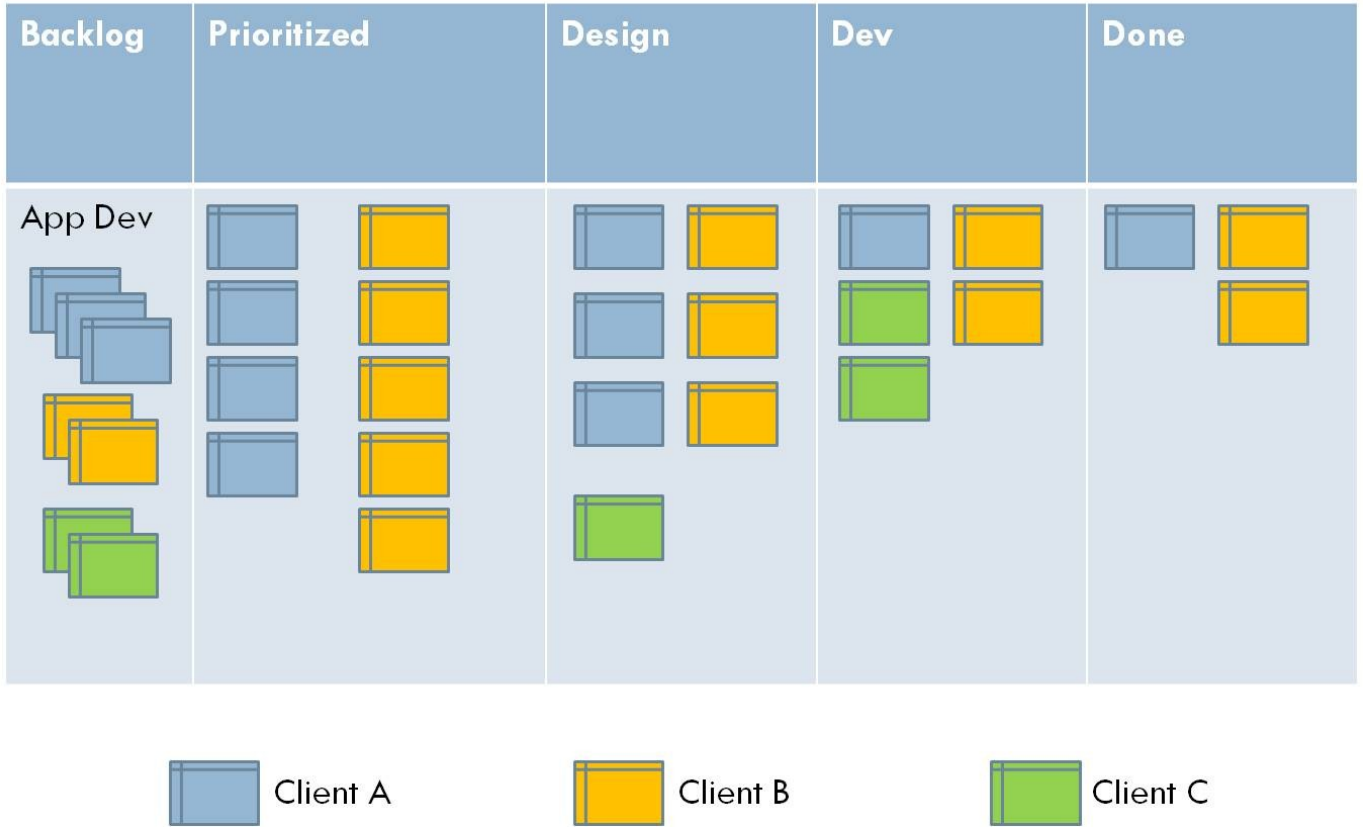


Backlog · Prioritized · Design · Dev · Done. 카드가 왼쪽에서 오른쪽으로 간다.

원래는 공장에서 왔습니다

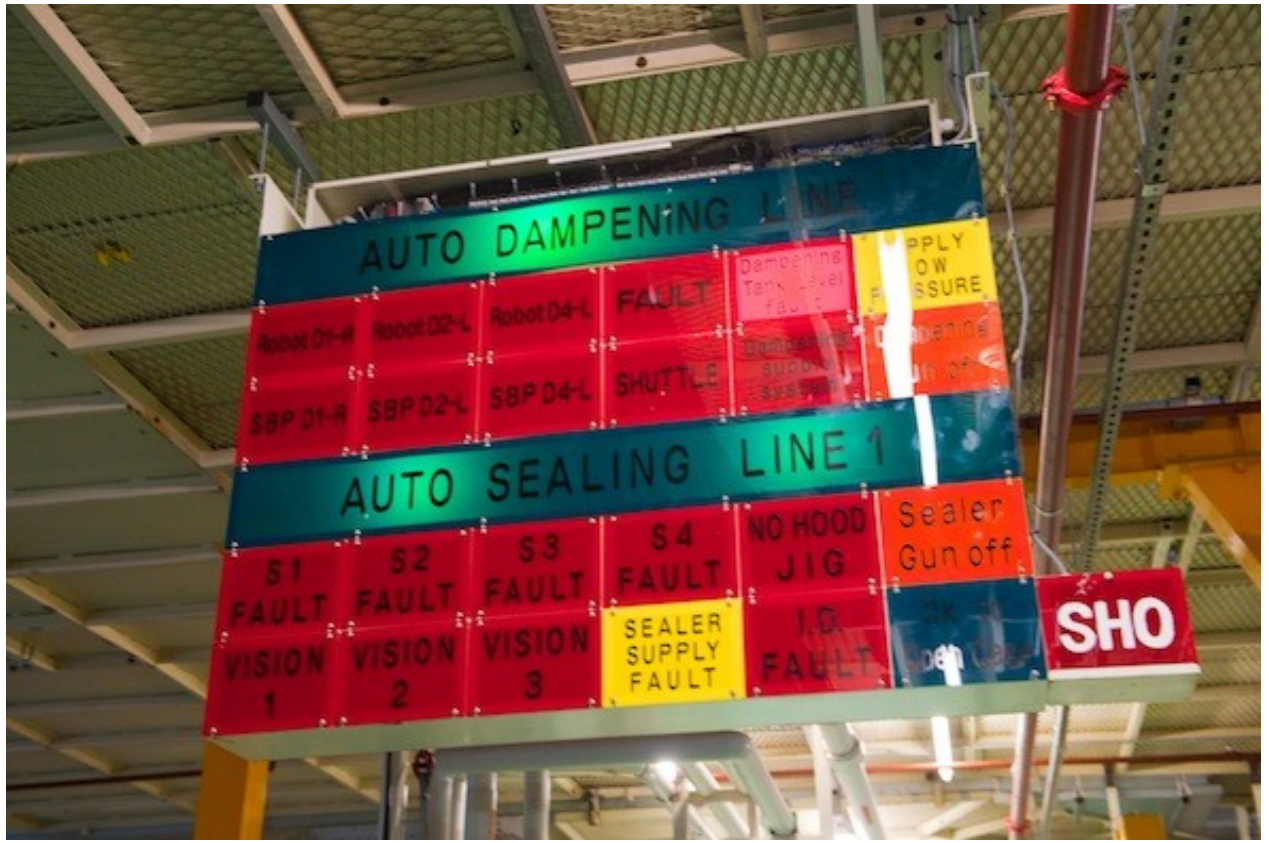

도요타 생산방식의 간판(看板). 지금 무엇이 밀려 있는지 한눈에 보이게 한다.

스프린트와 붙이면

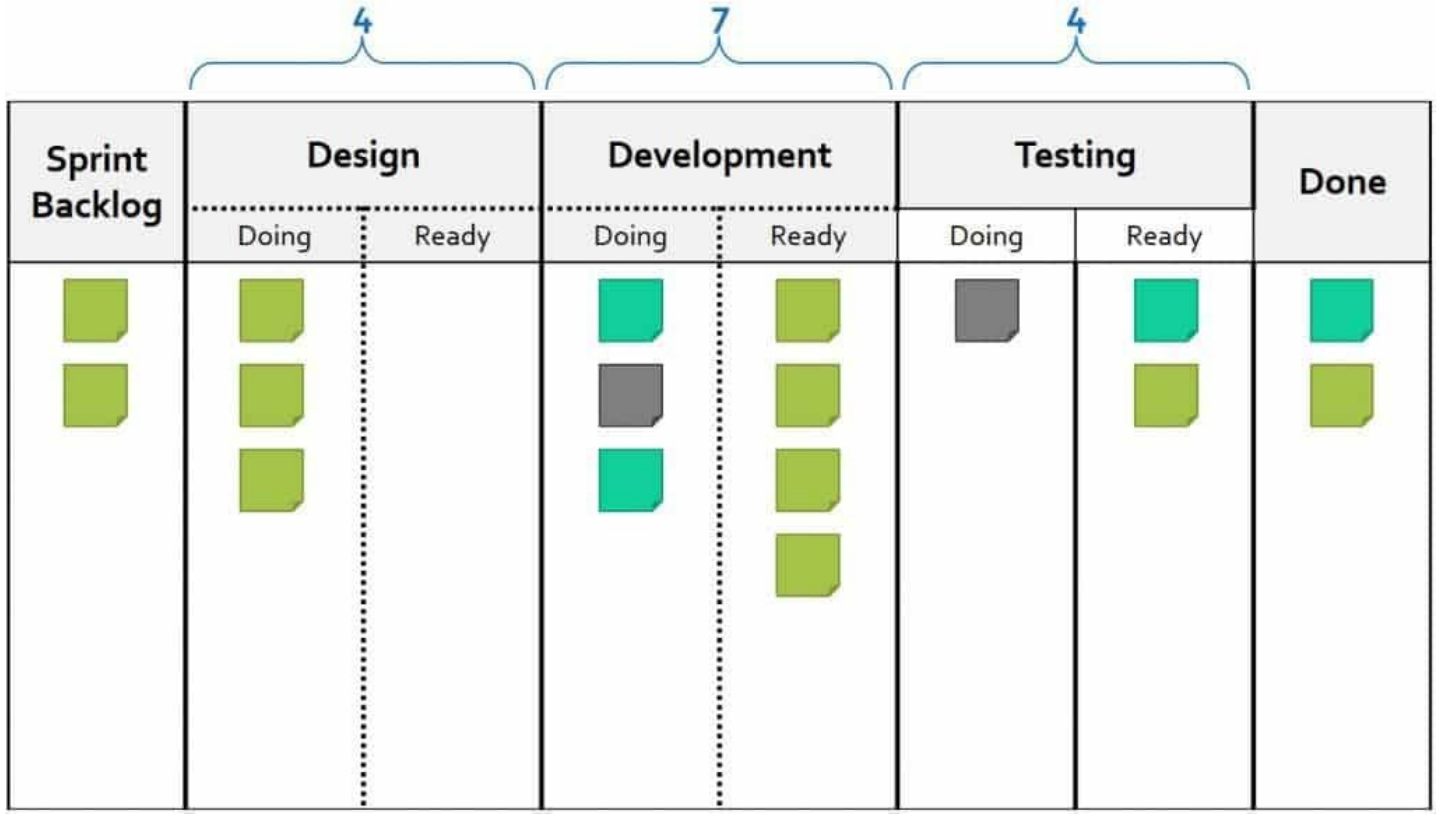

한 스프린트 안에서 카드가 어디까지 갔는지 본다.

1인 개발에서는

GitHub Issues 와 Projects 가 그대로 칸반입니다

그리고 이슈 번호가

커밋과 PR에 그대로 붙습니다

Staffing

원래는 사람을 배치하는 일입니다

몇 명을, 어떤 역량으로, 어떻게 동기부여할 것인가

올해 여러분의 Staffing은

일주일에 몇 시간을 어디에 쓸 것인가입니다

그것도 계획입니다

6. 쓰기

이제 글쓰기를 합니다

여기서 매년 질문이 나옵니다

이걸 왜 배워야 하나요

AI가 다 써주는데요

맞습니다

이제 초안은 AI가 씁니다

여러분이 백지에서 문장을 짜낼 일은 거의 없습니다

그런데

AI가 쓴 글의
어디가 잘못됐는지

알아볼 수 있습니까?

Git에서 했던 얘기와 같습니다

모르면 시킬 수 없고, 모르면 검증할 수 없습니다

그래서 문장 줄이기는
이제 쓰기 위해서가 아니라

고치기 위해 배웁니다

고전 사례 하나

벤저민 프랭클린이 전한 이야기


모자 가게 주인 John Thompson 의 간판 문구입니다

이런 간판입니다



모자 그림과 글씨가 함께 달린 간판. 여기 무엇을 적을 것인가.

처음 문구

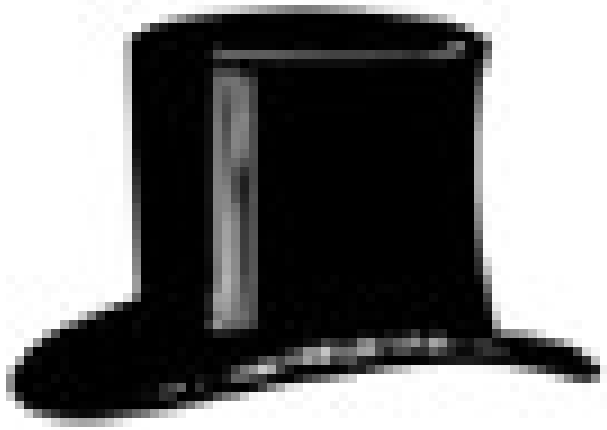

John Thompson, hatter, makes
and sells hats for ready money.

John Thompson, hatter, makes and sells hats for ready money — 그리고 모자 그림

친구들에게 보여줬습니다

하나씩 지워 나갑니다

① hatter 를 지운다

John Thompson, hatter, makes and sells hats for ready money

hatter 삭제

뒤에 '모자를 만든다'가 이미 있다. 같은 말을 두 번 하고 있다.

② makes 를 지운다

John Thompson, hatter, makes and sells hats for ready money

makes 삭제

손님은 누가 만들었는지 신경 쓰지 않는다. 좋은 모자를 사면 그만이다.

③ for ready money 를 지운다

John Thompson, hatter, makes and **sells hats** for ready money

for ready money 삭제

외상을 주지 않는 건 당시 누구나 아는 일이었다. 당연한 말은 적지 않는다.


④ sells hats 를 지운다

John Thompson, hatter, makes and sells hats for ready money

sells hats 삭제

간판에 모자 그림이 이미 달려 있다. 그림이 말하는 것은 글로 적지 않는다.

남은 것

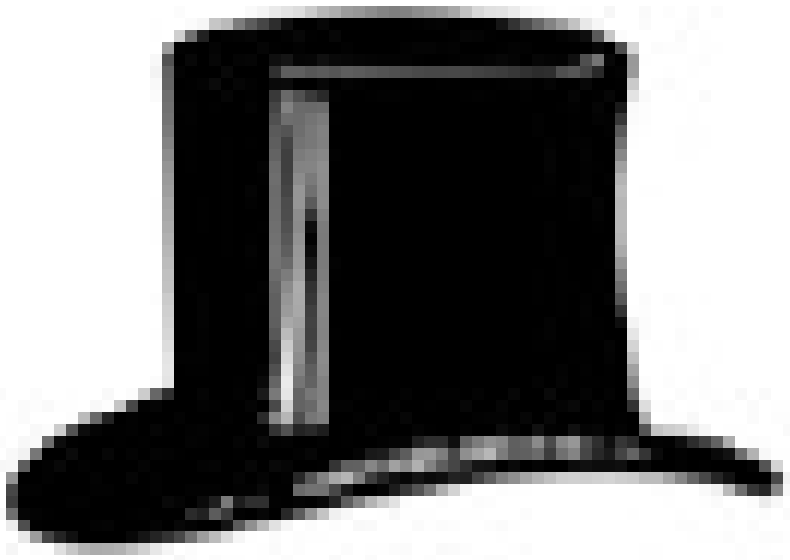

John Thompson

John Thompson — 그리고 모자 그림

네 번 지웠는데

지운 이유가 전부 다릅니다

지운 이유 네 가지

중복 — 이미 말한 것

관심 밖 — 상대가 궁금해하지 않는 것

당연한 것 — 말 안 해도 아는 것

그림이 대신하는 것 — 글이 아니어도 되는 것

AI가 쓴 문장도 이 넷으로 걸러집니다

뒤에서 다시 씁니다


장그래의 문장 줄이기

이 장면입니다



거기에 나온 문장의 단어를 적합한 무역용어로 바꾸고, 해당 약어가 있다면 표기해서 문장을 줄여 와.

결과물

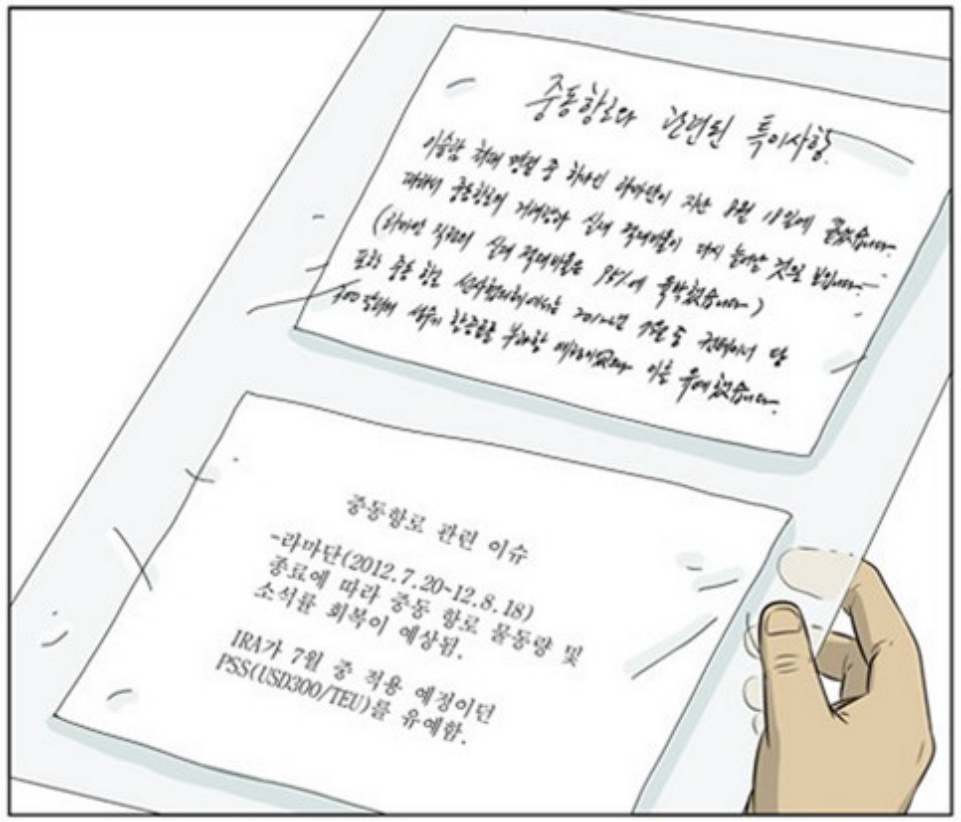

손으로 줄여 간 보고서. 줄이는 것은 요약이 아니라 재작성이다.

원문

중동항로와 관련된 특이사항

이슬람 최대 명절 중 하나인 라마단이 지난 8월 18일에 끝났습니다.
따라서 중동 항로의 거래량과 실재 적재 비율이 다시 늘어날
것으로 보입니다. (라마단 직전의 실재 적재 비율은 95%에 육박)
또한 중동 항로 선사협의체에서는 2012년 7월 중 컨테이너 당
300달러의 성수기 할증료를 부과할 예정이었으나 이를 유예했습니다.

한 줄씩 줄여 봅시다

① 제목

원문

중동항로와 관련된 특이사항

줄인 문장

중동항로 관련 이슈

부가적인 조사·동사·접속어를 쓰지 않는다. 가능한 한 짧은 단언으로.

② 사실

원문

이슬람 최대 명절 중 하나인 라마단이
지난 8월 18일에 끝났습니다.

줄인 문장

라마단 종료 (8/18)

아는 단어에 붙은 부연 설명은 지운다. 날짜는 최대한 짧게.

③ 전망

원문

따라서 중동 항로의 거래량과 실재 적재 비율이
다시 늘어날 것으로 보입니다.
(라마단 직전의 실재 적재 비율은 95%에 육박했습니다.)

줄인 문장

중동 항로 물동량 회복 예상

업계에서 통용되는 용어로 바꾼다. 의미 없는 설명은 지운다.

④ 조치

원문

또한 중동 항로 선사협의체에서는 2012년 7월 중
컨테이너 당 300달러의 성수기 할증료를
부과할 예정이었으나 이를 유예했습니다. (136쪽)

줄인 문장

중동 선사 협의체 성수기 할증료 유예 (300 USD, p136)

주저리주저리 쓰지 않는다. 근거는 괄호로 넘긴다.

줄인 결과

중동항로 관련 이슈

- 라마단 종료 (8/18)
- 중동 항로 물동량 회복 예상
- 중동 선사 협의체 성수기 할증료 유예 (300 USD, p136)

길이가 4분의 1이 됐는데

정보는 하나도 안 빠졌습니다

규칙으로 정리하면

문장 줄이기 다섯 가지

1. 조사 · 동사 · 접속어를 덜어낸다
2. 아는 단어에 붙은 설명을 지운다
3. 통용되는 용어와 약어로 바꾼다
4. 근거와 출처는 괄호로 넘긴다
5. 남은 것을 명사로 끝낸다

연습

이 문장을 줄여 보세요

본 프로그램은 빅데이터 R&E 교육프로그램 운영을 통해
학생들에게 빅데이터 기술에 대한 이해도를 높이고
대학의 빅데이터 연구 경쟁력을 높임으로써
새로운 고부가가치 산업으로 떠오르는 빅데이터 산업의
핵심 인력을 배출하고, 지속적인 산학협력 토대 구축을
목표로 한다.

푸는 순서

구조를 파악한다 — 무엇이 주어이고 무엇이 목적인가

공통 단어를 뽑는다 — 반복되는 말을 찾는다

의미 없는 단어를 지운다

남은 것을 자연스럽게 잇는다

제목을 뽑는다

결과

원문

본 프로그램은 빅데이터 R&E 교육프로그램 운영을 통해 학생들에게
빅데이터 기술에 대한 이해도를 높이고 대학의 연구 경쟁력을 높임으로써
핵심 인력을 배출하고 산학협력 토대 구축을 목표로 한다.

줄인 문장

다학제 융합, R&E, 도제식 교육을 지향

세 줄이 한 줄이 됐다. 남은 것은 정책의 뼈대뿐이다.

연습 줄이기 2

이 표를 한 줄로 줄여 보세요

다학제 융합	빅 데이터 기술은 통계학/수학, 컴퓨터 과학, 산업공학 등과 데이터 지식과 함께 금융, 특허, 헬스케어 등 다양한 도메인의 융합이 필요한 분야로 융합 교육을 지향함
R&E	빅 데이터 기술은 현재도 지속적으로 발전하고 있는 분야로 연구의 결과물을 교육의 자료로 활용함 (예: 논문에 사용한 연구 데이터를 수업 예제로 활용)
도제식 교육	빅 데이터 기술은 데이터 처리 기술과 함께 분석 대상이 되는 도메인의 지식이 필수적, 이를 효과적으로 교육하기 위해 각 분야의 교수들이 연구그룹을 형성하여 도제식 교육을 실시

세 칸에 각각 긴 설명이 붙어 있다. 이 장표가 원문이다.

결과

원문 (표 전체)

다학제 융합 · R&E · 도제식 교육에 대한

각 세 줄짜리 설명

줄인 문장

다학제 융합, R&E, 도제식 교육을 지향

표의 왼쪽 칸만 남기면 된다. 오른쪽은 근거이지 본문이 아니다.

7. 그래서 AI가 쓴 글은

요즘엔 이렇게 씁니다



초안은 몇 초면 나온다. 문제는 그다음이다.

AI가 쓴 기획서에는

거의 항상 같은 문제가 나옵니다

AI 글의 전형적인 네 가지 문제

1. 부풀린 수식 — 혁신적인, 최적화된, 강력한
2. 검증 불가능한 단언 — 빠르고 안정적인 시스템
3. 일반론 — 누구의 서비스에 붙여도 말이 되는 문장
4. 우선순위 없음 — 전부 필수로 적혀 있다

AI가 쓴 요구사항

원문

시스템은 사용자에게 혁신적이고 직관적인 경험을 제공하며,
빠르고 안정적인 성능으로 높은 만족도를 보장해야 한다.

줄인 문장

신고 목록 조회는 1초 이내 응답 (Must)

신고 등록은 3단계 이내로 완료 (Must)

형용사를 숫자로 바꾼다. 그러면 검증할 수 있는 문장이 된다.

고칠 때 던지는 질문 네 개

이 문장에서 숫자로 바꿀 수 있는 말은 무엇인가

이 문장은 어떤 서비스에 붙여도 말이 되는가

이 요구사항은 어떻게 확인할 것인가

이 중 이번 버전에서 뺄 것은 무엇인가

이 네 질문을 던질 수 있으면

AI가 쓴 기획서를 쓸 만한 기획서로 바꿀 수 있습니다

그게 오늘 배운
문장 줄이기입니다

AI에게 기획을 시키는 순서

이렇게 시킵니다

```
> 이 서비스 페르소나 3명 뽑아줘. 각자 목표와 불편을 한 줄씩
> 그중 김민수 기준으로 기능 요구사항 초안 만들어줘
> 비기능 요구사항은 전부 측정 가능한 숫자로 바꿔줘
> 이 중 이번 4주에 못 할 것을 Won't 로 옮겨줘
```

마지막 줄이 핵심입니다

빼는 결정은 AI가 못 합니다. 내 일정은 내가 압니다

무엇을 뺄지 아는 사람이
기획자입니다

8. 이번 학기 제출물

기획 산출물

페르소나

요구사항 명세서 — 기능 · 비기능, 우선순위 포함

유스케이스 — 주요 기능 3개 이상

기능 명세서

와이어프레임 · 스토리보드

스키마 정의서 · ERD

전부 AI로 초안을 뽑아도 됩니다

대신 숫자와 우선순위는 여러분이 고쳐 넣으세요

그리고 README 부터 쓰세요

한 페이지로 못 쓰면 아직 기획이 없는 것입니다

다음 시간까지

해 올 것

주제를 정한다

페르소나 한 명을 쓴다

이번 버전의 Scope 와 Out of Scope 를 적는다

Scope 한 줄이 제일 어렵습니다

그 한 줄이 이번 학기 전체를 결정합니다

END

감사합니다
